

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OS Nº	SN	VALOR LICITADO	R\$	126.883,52	REPLAN (%)	
CONTRATO Nº	021/2022	VALOR CONTRATADO	R\$	120.265,11		
FATOR K	0,8474	SERVIÇO EXCEDENTE	R\$	-	0,00%	
DATA DE INÍCIO	24-ago-22	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%	
PRAZO EXECUÇÃO (DD)	60	SERVIÇO SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%	
TERMINO PREVISTO	23-out-22	VALOR TOTAL	R\$	120.265,11	0,00%	
BM - PERÍODO	24/08/22	08/08/22	SALDO CONTRATUAL	R\$	13.918,90	11,58%
MEDICÃO Nº: 1		BM-1	EM - R\$ MENSAL	R\$	106.288,22	88,42%
			EM - R\$ ACUMULADO	R\$	106.288,22	88,42%

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO DA PONTE QUE FAZ A LIGAÇÃO ENTRE O ENGENHO BARRA DO SANGUE E A AGROVILA BARRA DE JANGADA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE.				
CONTRATADA	VITÓRIA RÉGIA SERVIÇOS EIRELI EPP	CNPJ:	97.350.503/0001-05		
PROCESSO Nº	016/2022	TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPI/PE - MAIO/2022 - "SEM" DESONERAÇÃO		
MODALIDADE Nº	DISPENSA 002/2022	BDI's	IMAT = 15,00%	SER = 20,00%	

## PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITENS	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATAIS							MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR											
					QUANTIDADES				FINANCEIRO			QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%									
					CTR	ADI	SLP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	ACITADO										SUPRIMIR	TOTAL							
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES																												
1.1	S	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEMPOSTES PARA FIXAÇÃO)	M²	6,00				6,00	359,09	1,0000	-	-	2.154,54		-	0,00%		-	0,00%			5,00	2.154,54	100,00%			
2.0	MOVIMENTO DE TERRA																												
2.1	S	SINAPI	93359	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	M³	24,90				24,90	82,01	1,0000	-	-	2.588,95	24,90	2.042,04	100,00%	24,90	2.042,04	100,00%			-	-	-	-	-	0,00%
2.2	S	SINAPI	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M³	4,74				4,74	72,29	1,0000	-	-	342,65	4,74	342,65	100,00%	4,74	342,65	100,00%			-	-	-	-	-	0,00%
2.3	S	CPU	CP-01	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATORIA	M²	24,90				24,90	8,57	1,0000	-	-	213,39	24,90	213,39	100,00%	24,90	213,39	100,00%			-	-	-	-	-	0,00%
3.0	TRANSPORTE / REMOÇÃO DO MATERIAL																												
3.1	S	CPU	CP-03	TRANSPORTE DE PEDRA RACHÃO COM CARRO DE MÃO, ATÉ 100M	M³	94,06				94,06	103,67	1,0000	-	-	12.007,69	94,06	12.007,69	100,00%	94,06	12.007,69	100,00%			-	-	-	-	-	0,00%
3.2	S	CPU	CP-02	REMOÇÃO DE METRALHA EM CAMINHÃO BASCULANTE, D.M.T 20 KM INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA.	M³	26,14				26,14	86,32	1,0000	-	-	2.256,40	26,14	2.256,40	100,00%	26,14	2.256,40	100,00%			-	-	-	-	-	0,00%
4.0	PONTE																												
4.1	S	CPU	CP-04	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DE GRAVIDADE EM PEDRA RACHÃO	M³	30,43				30,43	345,39	1,0000	-	-	103.444,89	14,60	91.882,94	88,83%	14,60	91.882,94	88,83%	15,74	5.439,44	51,73%	11,742,36	51,73%			
4.2	S	CPU	CP-05	VIGA METÁLICA EM PERFIL TR-37, FIXADO COM GRAUTE, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020_P	KG	3.972,60				3.972,60	20,50	1,0000	-	-	83.027,34	3.972,60	83.027,34	100,00%	3.972,60	83.027,34	100,00%			-	-	-	-	-	0,00%
4.3	S	SINAPI	43869	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSO 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M²)	KG	212,80				212,80	16,93	1,0000	-	-	3.581,42	212,80	3.581,42	100,00%	212,80	3.581,42	100,00%			-	-	-	-	-	0,00%

VITÓRIA RÉGIA SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ 97.350.503/0001-05  
 Gilverson Veríssimo da Silva Galado

Henrique Moreira Grizzi  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 14.671-D/PE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



OS Nº	SIN	VALOR LICITADO	R\$	126.883,52	REPLAN (%)
CONTRATO Nº	021/2022	VALOR CONTRATADO	R\$	120.285,11	
FATOR K	0,8474	SERVIÇO EXCEDENTE	R\$	-	0,00%
DATA DE INÍCIO	24-ago-22	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%
PRazo EXECUÇÃO (DD)	60	SERVIÇO SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%
TERMINO PREVISTO	22-out-22	VALOR TOTAL	R\$	120.285,11	0,00%
BM - PERÍODO	24/08/22 - 06/09/22	SALDO CONTRATUAL	R\$	13.916,90	11,58%
MEDICÃO Nº: 1	BM-1	BM - R\$ MENSAL	R\$	106.288,22	88,42%
		BM - R\$ ACUMULADO	R\$	106.288,22	89,42%

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO DA PONTE QUE FAZ A LIGAÇÃO ENTRE O ENGENHO BARRA DO SANGUE E A AGROVILA BARRA DE JANGADA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE.				
CONTRATADA	VITÓRIA RÉGIA SERVIÇOS EIRELI EPP	CNPJ:	37.359.503/0001-05		
PROCESSO Nº	016/2022	TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPIPE - MAJ02022 - "SEM" DESONERAÇÃO		
MODALIDADE Nº	DISPENSA 002/2022	BDI %	MAT = 15,00%	SER = 20,00%	

## PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITENS	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS																				
					QUANTIDADES				FINANCIERO			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR							
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITARIO	FATOR K	ADITADO	SUPRIMIR	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%			
4,4	S	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	12,00			12,00	527,16	1,0000			6,325,92			0,00%				12,00	6,325,92			
<b>TOTALIZAÇÃO =</b>														120.285,11			106.288,22	88,42%			106.288,22	88,42%		13.916,90	11,58%
EMPRESA					ENGENHEIRO FISCAL					TÉCNICO FISCAL					SECRETÁRIO DE OBRAS										
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO					ATESTO					ATESTO					ATESTO										
					 Henrique Moreira Gizzi - Engenheiro Civil CREA 14.671-D/PE																				

**BM-1**

DATA : quinta-feira, 8 de setembro de 2022

VALOR: R\$ 106.288,22

CENTO E SEIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS, E VINTE E DOIS CENTAVOS

**VITÓRIA RÉGIA SERVIÇOS EIRELI**  
 CNPJ 37.359.503/0001-05  
 Gilversil Verissimo da Silva Calado



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



**OBJETO** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO DA PONTE QUE FAZ A LIGAÇÃO ENTRE O ENGENHO BARRA DO SANGUE E A AGROVILA BARRA DE JANGADA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE.

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - "01" - MEMÓRIA**

DATA INI = 24/08/22

DATA FIM = 08/09/22

IT	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇO	UN	MEDIDAS							
					C	L	H	QTDE	A	V	PESO / %	TOTAL
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>												
1.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M²								
<b>2.0 MOVIMENTO DE TERRA</b>												
2.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³								24,90
			PONTE						2,00		5,25	10,50
			PONTA DE ALA						4,00		3,60	14,40
2.2	SINAPI	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M³								4,74
			PONTE						2,00		0,87	1,74
			PONTA DE ALA						4,00		0,75	3,00
2.3	CPU	CP-01	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATORIA	M²								24,90
			PONTE						2,00		5,25	10,50
			PONTA DE ALA						4,00		3,60	14,40
<b>3.0 TRANSPORTE / REMOÇÃO DO MATERIAL</b>												
3.1	CPU	CP-03	TRANSPORTE DE PEDRA RACHÃO COM CARRO DE MÃO, ATÉ 100M	M³								94,06
			PONTE						2,00		24,99	49,98
			PONTA DE ALA						4,00		11,02	44,08
3.2	CPU	CP-02	REMOÇÃO DE METRALHA EM CAMINHÃO BASCULANTE, D.M.T 20 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA.	M³								26,14
			PONTE						2,00		5,51	11,02
			PONTA DE ALA						4,00		3,78	15,12
<b>4.0 PONTE</b>												
4.1	CPU	CP-04	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DE GRAVIDADE EM PEDRA RACHÃO	M³								14,69
			PONTE						2,00		17,85	35,70
			PONTA DE ALA						4,00		7,87	15,74
			EXISTENTE		3,50	3,50	1,50	2,00			50,00%	-36,75
4.2	CPU	CP-05	VIGA METÁLICA EM PERFIL TR-37, FIXADO COM GRAUTE, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG								3.972,60
			VIGAS LONGITUDINAIS - PERFIL COM H=12" = 304,80mm		6,00				6,00		81,85	2.946,60
			VIGAS TRANSVERSAIS - PERFIL COM H=6" = 152,40mm		10,00				4,00		25,65	1.026,00
4.3	SINAPI	43658	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA CSG 20, E = 0,85 MM (7,60 KG/M²)	KG	7,00	4,00					7,60	212,80
4.4	SINAPI	89838	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M								

HENRIQUE MOREIRA Assinado de forma digital  
 GRIZZI:34995676449 por HENRIQUE MOREIRA  
 GRIZZI:34995676449

**VITÓRIA RÉGIA SERVIÇOS EIRELI**  
**CNPJ 37.350.503/0001-05**  
 Gilversil Veríssimo da Silva Calado



## SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA (SE)

PORTARIA N 2.204, DE 07 DE JULHO DE 2022

## AÇÕES DE RESPOSTA AO DESASTRE

### META 01

#### INFORMAÇÕES - DADOS

<b>MUNICÍPIO:</b>	<b>CORTÊS</b>
<b>ESTADO:</b>	<b>PERNAMBUCO</b>
<b>DATA DO DESASTRE</b>	<b>02 DE JULHO DE 2022</b>
<b>COBRADE</b>	<b>1.3.2.1.4 - CHUVAS INTENSAS</b>
<b>DECRETO MUNICIPAL</b>	<b>DM Nº 095, DE 02 DE JULHO DE 2022</b>



HENRIQUE MOREIRA Assinado de forma  
GRIZZI:34995676449 digital por HENRIQUE  
MOREIRA  
GRIZZI:34995676449

VITÓRIA RÉGIA SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ 37.350.503/0001-05  
Gilversil Veríssimo da Silva Calado  
PAG.: 1/3





**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 - PONTE BARRA DO SANGUE**





Assinado de forma digital por HENRIQUE MOREIRA  
HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:34995676449  
MOREIRA GRIZZI:34995676449

VITÓRIA RÉGIA SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ 37.350.503/0001-05  
Gilversil Veríssimo da Silva Calado





### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 - PONTE BARRA DO SANGUE

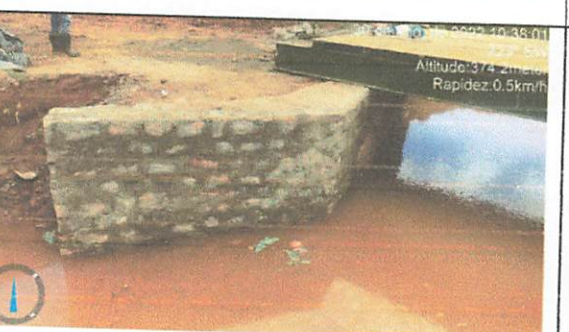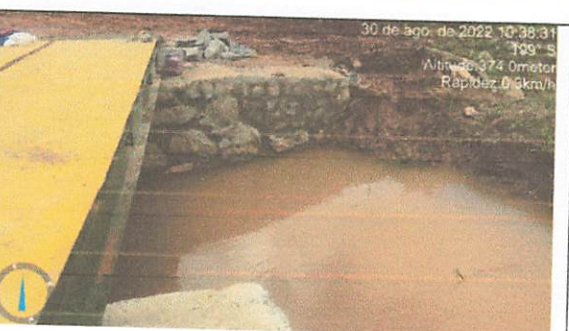

HENRIQUE  
MOREIRA  
GRIZZI:3499567644  
9

Assinado de forma  
digital por  
HENRIQUE MOREIRA  
GRIZZI:34995676449

VITÓRIA RÉGIA SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ 37.350.503/0001-05  
Gilversil Veríssimo da Silva Calado  
PÁG.: 3 / 3
